

# INFORME DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ

## DEL PAD LES CORTS

### 2008-2011

***1r SEMESTRE 2008***



# INDEX

	PÀGINA
1. INTRODUCCIÓ	3
2. PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PERÍODE	
2.1. NOVA ESTRUCTURA DEL PAD LES CORTS	4
2.2. DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE L'ESTAT EXECUCIÓ DEL PAD	5
3. ESTAT EXECUCIÓ DE LES LÍNIES I MESURES DEL PAD 2008-2011	9
4. CONCLUSIÓ	10

## **1. INTRODUCCIÓ**

Presentem l'Informe de l'Estat d'Execució del 1r semestre 2008 del Pla d'Actuació del Districte (PAD) de Les Corts 2008-2011.

Es fa una anàlisi, tant quantitatiu com qualitatiu, de quin és l'estadi d'execució que es troben les línies i mesures d'acció aprovades, en el Consell Plenari del districte de Les Corts, el passat mes de desembre 2007.

El document del Pla d'Actuació del Districte de les Corts es presenta amb una altra estructura, per tal d'homogeneïtzar una sola tipologia de categorització de les línies i mesures tant del pla d'actuació Municipal (PAM), com dels 10 plans d'actuació dels districtes.

Aquesta nova distribució està basada amb l'estructura executiva de l'Ajuntament de Barcelona.

Resultat d'aquesta nova organització estructural del PAD Les Corts, presentem el document definitiu amb 6 Línies i 187 mesures.

Però, destacar que totes i cada una de les línies que s'aprovaren del PAD el mes de desembre de 2007, estan a dins del nou document.

## 2. PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PERÍODE


### 2.1. NOVA ESTRUCTURA DEL PAD LES CORTS

El document del PAD Les Corts 2008-2011 que presentem en aquest primer informe, s'estructura en 6 línies temàtiques que recullen 184 mesures


<b>Línia 1</b>		<b>Benestar i Cohesió Territorial</b>
	<b>1.1</b>	Educació
	<b>1.2</b>	Dones
	<b>1.3</b>	Joventut
	<b>1.4</b>	Cultura
	<b>1.5</b>	Participació Ciutadana
	<b>1.6</b>	Cooperació Internacional
<b>Línia 2</b>		<b>Medi Ambient</b>
	<b>2.1</b>	<b>Verd i Biodiversitat</b>
	<b>2.2</b>	<b>Manteniment i Neteja</b>
	<b>2.3</b>	<b>Recursos i reciclatge</b>
<b>Línia 3</b>		<b>Promoció Econòmica i Comerç</b>
	<b>3.1</b>	<b>Promoció Econòmica i Ocupació</b>
	<b>3.2</b>	<b>Comerç i Mercats Municipals</b>
<b>Línia 4</b>		<b>Habitatge, Urbanisme i Règim Interior</b>
	<b>4.1</b>	<b>Habitatge i Paisatge Urbà</b>
	<b>4.2</b>	<b>Urbanisme i Obres</b>
	<b>4.3</b>	<b>Pla Equipaments</b>
	<b>4.4</b>	<b>Règim Interior</b>
<b>Línia 5</b>		<b>Acció Social i Ciutadania</b>
	<b>5.1</b>	Acció Social
	<b>5.2</b>	Infància
	<b>5.3</b>	Gent Gran
	<b>5.4</b>	Persones amb discapacitats
	<b>5.5</b>	Salut Pública
	<b>5.6</b>	Drets Civils
<b>Línia 6</b>		<b>Prevenició Seguretat i Mobilitat</b>
	<b>6.1</b>	<b>Prevenició i Seguretat</b>
	<b>6.2</b>	<b>Mobilitat i accessibilitat</b>

6 LÍNIES	186 MESURES
Benestar i Cohesió Territorial	29
Medi Ambient	22
Promoció Econòmica i Comerç	16
Habitatge, Urbanisme i Règim Interior	69
Acció Social i Ciutadania	23
Prevenició, Seguretat i Mobilitat	27


## 2.2. DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE L'ESTAT EXECUCIÓ DEL PAD LES CORTS 1R SEMESTRE 2008

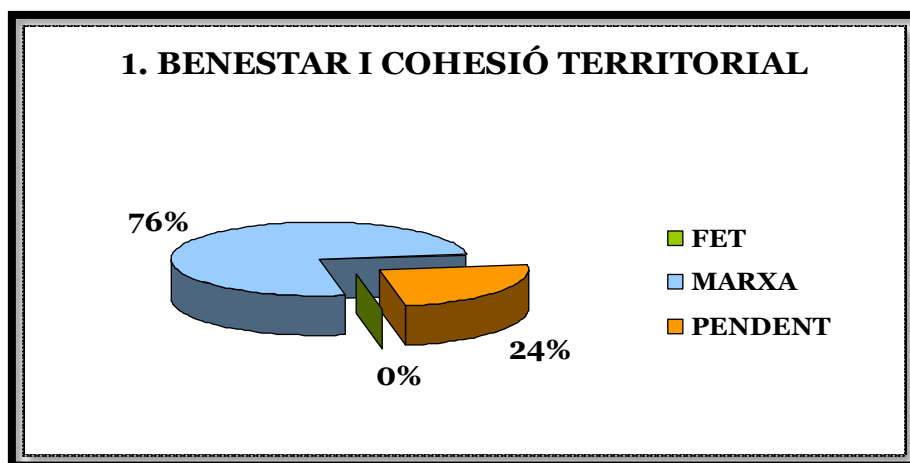

*De l'àrea de Benestar Social i Cohesió Territorial  
estan en marxa 22 mesures, 7 estan pendents  
d'inici i 0 de finalitzades.*

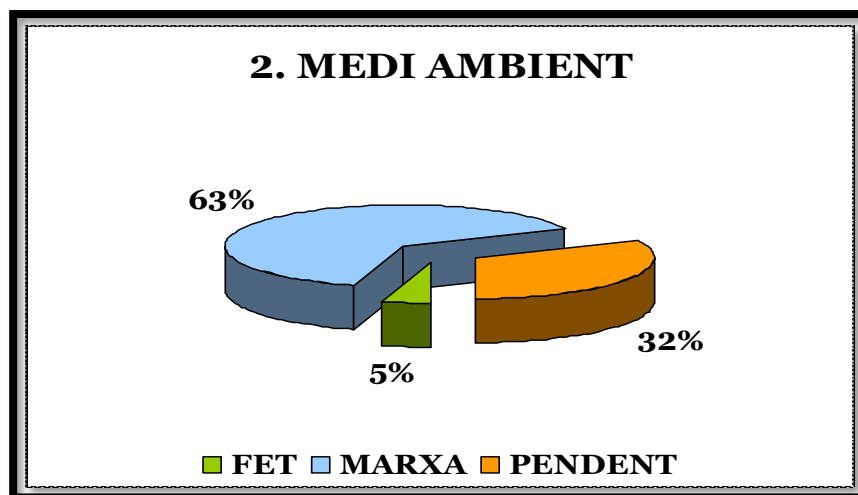


*De l'àrea de Medi Ambient estan en marxa 14 mesures, 7 estan pendents d'inici i 1 de finalitzada.*

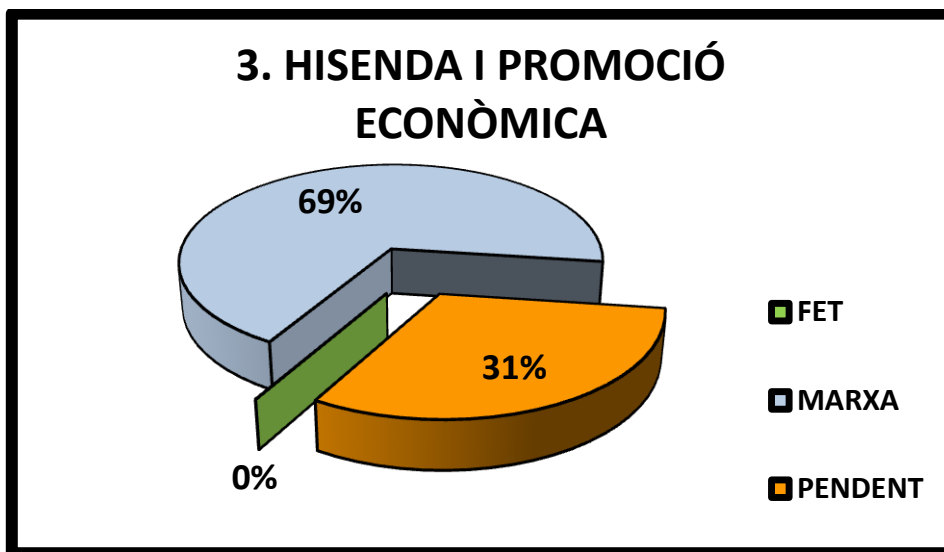


*De l'àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica estan en marxa 11 mesures, 5 estan pendents d'inici i 0 de finalitzades.*

#### 4. HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR

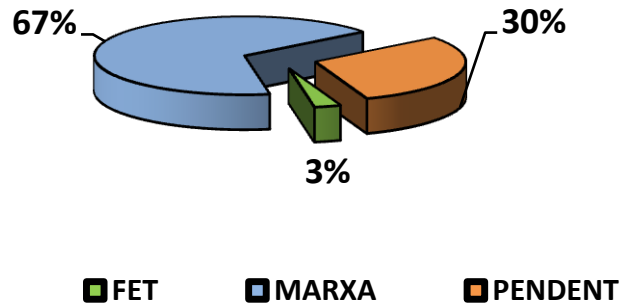


*De l'àrea d'Habitatge, Urbanisme i Règim Interior estan en marxa 47 mesures, 21 estan pendents d'inici i 1 de finalitzada.*

#### 5. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA



*De l'àrea d'Acció Social i Ciutadania estan en marxa 17 mesures, 6 estan pendents d'inici i 0 de finalitzades.*

## 6. PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT



*De l'àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat estan en marxa 22 mesures, 5 estan pendents d'inici i 0 de finalitzades.*



**3. ESTAT EXECUCIÓ DE LES LÍNIES I MESURES DEL PAD 2008-2011**  
***(1r Semestre 2008)***

## 1 Benestar i Cohesió territorial (Educació, Cultura i Benestar)

### Educació

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.18	1	1	Nous canals per tal de què les escoles enforteixin les entitats de voluntariat aquestes facilitin educació en valors	2/2010				S'està treballant en el marc del Projecte "Bons Veïns, Millor Barri", un projecte específic amb les escoles de primària.
1.19	1	2	Difondre oferta activitats socials del Dte. als centres educatius	2/2009				S'han iniciat els treballs interns a nivell tècnic.
1.20	1	3	Fer Catàleg de tots els centres del Dte.	2/2009				S'han iniciat els treballs interns a nivell tècnic.
1.21	1	4	Estudi tècnic per millorar la seguretat a les sortida-entrada a les escoles	2/2010				Es troba en marxa la primera fase del projecte consistent en la inspecció de totes les escoles per a l'elaboració de l'estudi tècnic
1.22	1	5	Grup de treball en el Consell Escolar pel seguiment de l'absentisme escolar	1/2011				Està en marxa la creació de la comissió d'absentisme escolar del districte
2.14	1	6	Obertura de patis escolars fora d'horari lectiu	1/2011				Està previst l'obertura del pati del CEIP Les Corts en el curs 2008-2009
10.19	1	7	Concretar al Consell Escolar els nous camins escolars a implantar	1/2011				Com a tràmit previ a l'estudi i proposta de nous Camins Escolars, s'ha posat en marxa com a primera fase, la revisió del Camí Escolar del CEIP Barcelona

### Dones

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.10	1	8	Reforçar el PIAD amb nou programa de difusió	4/2009				Ha estat incorporat el PIAD a l web del Districte. En marxa el disseny del programa de difusió del PIAD, implementació el 2009.
1.11	1	9	Difusió sobre l'eradicació de la violència de gènere	4/2010				
1.34	1	10	Incloure perspectiva de gènere a les polítiques del districte	1/2011				
1.35	1	11	Potenciar programes de formació en TIC	1/2011				S'està dissenyant un curs específic d'Internet amb la previsió d'iniciar durant el curs 2008-2009

### Joventut

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.1	1	12	Crear Punt d'Informació Juvenil	1/2009				S'ha definit i concretat la ubicació en el Casal de Joves i s'està treballant amb el projecte d'adequació dels espais.
1.3	1	13	Treball en xarxa de les entitats joves	1/2011				Les primeres sessions de treball amb les entitats ja estan en funcionament.
1.4	1	14	Signar Acord de col·laboració entre les entitats de la Plataforma	2/2009				S'han engegat les primeres reunions de treball amb la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts.
1.5	1	15	Difusió, coneixement i desenvolupament dels projectes i activitats de les entitats juvenils i entitats del lleure	4/2008				Previsió d'instauració el mes de setembre un punt d'informació juvenil a l'IES Ausias March, s'està treballant amb l'IES Joan Bosch , i en funcionament ja està a l'IES Les Corts.
1.6	1	16	Impulsar nou habitatge de lloguer per a joves	1/2011				Caldrà treballar-ho en futurs planejaments. No s'ha iniciat cap.

## Cultura

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.3	1	17	Consolidar la Comissió de Lectura Pública	1/2011				
14.6	1	18	Difondre el patrimoni històric i cultural del districte	1/2011				Es fa accessible el fons documental ; s'organitzen activitats de difusió Cultural amb l'objectiu de fomentar l'estudi i difondre el coneixement del patrimoni; i s'han portat a terme un seguit de tallers com "Descobrir l'Arxiu Municipal de les Corts:viatja per la teva història a través dels documents"
15	1	19	Recuperar la memòria històrica donant compliment a la llei	1/2011				S'està treballant amb la retirada del monument Primo de Rivera i la Senyalització de la presó de les Dones.

## Participació ciutadana

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.1	1	20	Enfortir els consells sectorials	1/2011				S'està treballant amb un estudi-diagnosi de la realitat dels consells sectorials del districte, per així poder fer propostes de futur amb la finalitat d'enfortir-los
12.2	1	21	Potenciar els òrgans de participació del districte, impulsant un treball en xarxa	4/2010				S'estan programant unes jornades de participació pel segon semestre 2008, per així fer un treball amb xarxa amb les diferent entitats del territori i que participen en els òrgans formals de participació.
12.5	1	22	Diagnosi de situació i necessitats del teixit associatiu	2/2009				S'ha iniciat un estudi de diagnosi de l'actual teixit associatiu del districte, per així detectar les seves necessitats, realitats i crear un mapa de relacions entre les entitats i l'administració.
12.7	1	23	Impulsar els Consells de Barri	2/2009				És una línia de ciutat i s'impulsarà a nivell global. S'han realitzat dues reunions amb la Junta de Portaveus.
12.8	1	24	Crear la Comissió de Municipis Limitrofs (municipis i districtes)	1/2009				S'ha convocat i desenvolupat la primera reunió a amb els agents implicats.
12.9	1	25	Aprovar reglament de funcionament dels Consells sectorials i comissions de treball	4/2010				S'ha posat en marxa aquesta mesura amb les primeres reunions amb la Direcció de Participació per revisar els models existents a nivell de ciutat i d'altres districtes i per poder fer una proposta de redacció
12.10	1	26	Millorar sistema de convocatòria a les sessions participatives del districte (web)	1/2009				
14.4	1	27	Donar a conèixer les entitats i els seus serveis a través dels mitjans municipals	1/2010				S'ha iniciat la posada en marxa de la difusió d'entitats a través de les revistes municipals
14.5	1	28	Difusió de les activitats de les entitats	1/2010				Està en marxa l'estudi de possibles sistemes de difusió

## Cooperació internacional

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	En marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.6	1	29	Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació	1/2011				S'ha creat el Consell de Cooperació i Drets Civils del districte i en les primeres sessions de treball s'han definit les accions a portar a terme durant el 2008.

## 2 Medi ambient

### Verd i biodiversitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.2.5	2	1	Estudiar i revisar urbanització Jardins Vicens i Vives, per fer-lo accessible	4/2009					S'ha començat a treballar amb Parcs i Jardins en l'anàlisi de la situació actual
9.2.1	2	2	Disseny participatiu del futur Can Rigal	4/2009					
9.2.2	2	3	<b>Nou hort urbà i zona verda a Av Pearson</b>	<b>1/2008</b>					
9.2.3	2	4	Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina	4/2008					Les obres segueixen a bon ritme.
9.2.4	2	5	Millora zona verda entorn Monestir de Pedralbes	4/2009					
9.2.5	2	6	Millora del verd al voltant pl. Sòl de Baix	4/2009					
9.2.6	2	7	Recuperar espai públic dels Campus Universitaris	4/2009					Està en fase de redacció del projecte
9.2.7	2	8	Millora entorn antic Monument als Caiguts	4/2009					
9.2.8	2	9	Millora Jardins Goday i Casals	4/2009					Està en fase de redacció del projecte per part de Parcs i Jardins
11.6	2	10	Creació de nova àrea d'esbarjo pels gossos	4/2011					Està en fase de concreció de la ubicació.

### Manteniment i Neteja

#### Neteja i recollida

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.3	2	11	Desenvolupar un nou Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic i millora del mobiliari i arbrat	1/2011					S'ha concretat amb el Sector de Mediambient les accions a desenvolupar durant els 4 anys

### Recursos i reciclatge

#### Consum i estalvi

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
7.1	2	12	Campanya per la reducció del consum elèctric i estalvi d'aigua	1/2011					S'han començat a posar en marxa accions de sensibilització com de distribució d'estalviadors d'aigua en la Mostra d'Entitats del Districte.
7.2	2	13	Bombetes de baix consum a l'enllumenat de Nadal	1/2011					anyal 2008-09-10

Residus									
CODI PAD 2008- 2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.1.4	2	14	Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil	4/2008					S'està fent una revisió de la actual.
10.2.1	2	15	Estudi per implantar recollida pneumàtica	1/2011					
10.2.2	2	16	Revisar recollida selectiva al Casc antic	4/2008					
10.2.3	2	17	Posar punts de recollida selectiva d'objectes petits als CC, biblioteques, etc	4/2009					
10.2.4	2	18	Revisar i ampliar, si s'escau, freqüència buidatge de papereres	4/2008					Iniciat l'estudi de l'estat actual per fer millores en el a propera Contracta de Neteja i recollida.

Sensibilització i Agenda 21									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.1.1	2	19	Difusió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Ag 21)	4/2010					
10.1.2	2	20	Desplegar el programa d'Oficina Verda	1/2011					S'ha iniciat la mesura amb la creació d'una taula interdepartamental
10.1.3	2	21	Impulsar l'Ag 21 Escolar	4/2009					
10.1.5	2	22	Treballar amb les entitats el desenvolupament sostenible de la Festa Major	1/2011					S'està treballant en el marc de la Comissió de Feta Major.

### 3 Hisenda i Promoció econòmica (Promoció Econòmica)

#### Promoció econòmica i ocupació

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
5.1	3	1	Recursos per la orientació laboral i professional, demanant i impulsant una OTG al dte.	1/2011				

#### Comerç i Mercats municipals

Comerç i consum								
CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
4.1	3	2	Consolidar l'eix comercial Sants-Les Corts	1/2011				S'han començat a treballar amb l'eix per revisar i millorar l'organització
4.2	3	3	Suport a les activitats de les associacions de comerciants	1/2011				Es continua acompanyant i impulsant accions concretes de promoció
4.3	3	4	Vetllar per un impacte comercial positiu del futur projecte Barça	1/2011				
4.4	3	5	Potenciar l'associacionisme comercial i el petit comerç de barri (Casc Antic)	1/2011				S'està treballant amb l'elaboració d'un estudi comercial
4.5	3	6	Fer Plànol Comercial i Turístic del Dte.	2/2010				S'està portant a terme un treball de recerca i recull de dades, elaborant un llistat de futurs destinataris i s'estableixen contactes amb diferents agents per a valorar les diferents propostes que es presentin pel producte final.
4.6	3	7	Impulsar la Campanya de Normalització Lingüística de Comerços	1/2011				Es va presentar la Campanya de Normalització Lingüística en el marc del Consell de Promoció Econòmica i Comerç.
4.7	3	8	Reforçar i promoure iniciatives innovadores dels centres comercials	1/2011				S'ha iniciat l'estudi i anàlisi de les possibilitats d'ús conjunt dels Centres Comercials en l'atenció al ciutadà.
4.8	3	9	Integració del comerç regentat per immigrants	1/2011				
4.9	3	10	Impulsar el nou eix comercial Europa-Anglesola	1/2011				
4.15	3	11	Recull fonts bàsiques d'ajut al comerç (guia)	1/2011				
4.10	3	12	Millora de la neteja, enllumenat, a recollida d'escombreries als eixos comercials	1/2011				
4.11	3	13	Millorar i ampliar les zones de càrrega-descàrrega	1/2011				Es treballa en coordinació amb les Associacions i entitats comercials per atendre les demandes de millora
4.12	3	14	Promoure el comerç just i sostenible	1/2011				S'ha començat a treballar en el marc del Consell de Cooperació, accions concretes
4.13	3	15	Revisar Pla d'Usos per evitar concentració sectorial	4/2009				S'està treballant amb la nova proposta del Pla

#### Mercats

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
4.14	3	16	Potenciar el mercat de Les Corts i les seves activitats	1/2011				S'està treballant amb el Mercat, amb col·laboració i participació, en més activitats (exemple: torna a participar en la Festa Major del Districte)

**4 Habitatge, Urbanisme i Règim interior (Urbanisme i Infraestructures)****Habitatge i Paisatge urbà**

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.4.1	4	1	Política Construcció habitatge de protecció i reallotjament . Desenvolupament PERI EUROPA- ANGESOLA	1/2011					S'està treballant en la redacció dels projectes de construcció de l'edifici de reallotjament, de construcció de l'Escola Bressol i en el projecte d'urbanització de l'àmbit
8.4.2	4	2	Política Construcció habitatge de protecció i reallotjament . Desenvolupament PERI COLÒNIA CASTELLS	1/2011					Està en contrucció l'edifici de reallotjament de la 1a fase i està en tràmit de projecte els edificis de reallotjament de la 2a i 3a fase
8.4.3	4	3	Política Construcció habitatge de protecció i reallotjament . Desenvolupament PERI BACARDÍ	1/2011					S'ha finalitzat l'obra de l'edifici del c. Benavent amb un total de 35h. Dels quals 22 són per a reallotjament d'afectats urbanístics i 13 són de protecció que es troben adjudicats i en diferents tràmits d'escripturació. I eestà en fase de redacció de projecte l'urbanització de l'entorn.
14.3	4	4	Creació de Oficina Habitatge	2/2009					S'està treballant en la localització dela seva ubicació

Urbanisme i Obres			Urbanisme i Infraestructures						
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.2.1	4	5	Arranjament Pl. Can Rosés	4/2009					Fase de redacció del projecte
8.2.2	4	6	Arranjament Pl. Dr. Ignasi Barraquer	1/2009					
8.2.3	4	7	Arranjament Zona Entença- Av. De Sarrià	4/2009					Fase de redacció del projecte
8.2.4	4	8	Col·laborar Dte. Eixample per retirada monument a José Antonia Primo de Rivera i la seva reurbanització	3/2008					Projecte redactat, obra adjudicada pendent inici d'obres
8.5	4	9	Actualitzar Mapa Fibra Òptica	4/2009					S'ha iniciat l'estudi per revisar l'estat actual
9.3.2	4	10.1	Continuar expropiacions: PERI Bacardí	4/2011					
9.3.1	4	10.2	Continuar expropiacions: C. Danubi (de Trav. De Les Corts a C. Cardenal Reig)	4/2011					
9.3.3	4	10.3	Continuar expropiacions: Trav. De Les Corts - Av. St Ramon.	4/2011					
14.2	4	11	Garantir informació als afectats dels plans urbanístics	1/2011					A través de les Comissions de Seguiment i reunions específiques amb els afectats
6.1.1	4	12	Campus Diagonal Portal de coneixement: "xarxa museística" d'exteriorització dels museus en les facultats i equipaments universitaris	1/2011					S'està començant a treballar en una taula tècnica de coordinació amb la universitat de Barcelona
6.1.2	4	13	Campus Portal de coneixement:Posada en marxa sala exposicions oberta al dte des del projecte ampliació Facultat Belles Arts	1/2011					S'està començant a treballar en una taula tècnica de coordinació amb la universitat de Barcelona
6.1.3	4	14	Campus Portal de coneixement:Millora i obertura dels pavellons Güell i resta d'elements Gaudí	1/2011					



Les Corts									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.1	4	15	Urbanització i millora c/ Novell (entre Vallespir i Guitard)	4/2009					Projecte redactat, pendent de licitació
8.1.2	4	16	Urbanització i millora c/ Caballero (entre Guitard i Nicaragua)	4/2010					En fase de redacció de projecte
8.1.3	4	17	Urbanització i millora c/ Evarist Arnús (entre Vallespir i Guitard)	4/2009					Projecte redactat, pendent de licitació
8.1.5	4	18	Urbanització i millora c/ Taquígraf Martí (de Joan Guell a Galileu)	4/2010					En fase de redacció de projecte
8.1.6	4	19	Urbanització i millora Travessera de les Corts (d'Av. Sarrà a Numància)	1/2011					
8.1.7 i 8.1.4	4	20	Urbanització i millora c/ Taquígraf Garriga (d'Av. Sarrià a Numància).Urbanització i millora c/ Berguedà (entre Trav. Les Corts a Taquígraf Garriga)	4/2009					En fase de redacció de projecte
8.1.8	4	21	Urbanització i millora c/ Anglesola (a Dr. Ibáñez)	4/2010					En fase de redacció de projecte
8.1.9	4	22	Urbanització i millora Av Madrid (entre Gran Via Carles III i Numància)	1/2011					
8.1.10	4	23	Estudi Reordenació c/ Prat d'en Rull (entre Travessera i Taquígraf Garriga)	4/2010					En fase de redacció del projecte

## La Maternitat i Sant Ramon

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.11	4 24	Urbanització i millora Ptge. Regent Mendieta (d'Av. Madrid a Regent Mendieta)	1/2011					En fase de redacció del projecte
8.1.12	4 25	Urbanització i millora c/ Comte Güell (de Trav. Les Corts a Av. De Madrid)	4/2009					Projecte redactat pendent de licitació
8.1.13	4 26	Urbanització i millora c/ Emèrita Augusta (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz)	4/2009					Projecte redactat pendent de licitació
8.1.14	4 27	Urbanització i millora Ptge. Jaume Roig (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz)	1/2011					En fase de redacció del projecte
8.1.15	4 28	Urbanització i millora c/ Salvador Cardenal (de Maternitat a Sabino de Arana)	4/2009					Projecte redactat pendent de licitació
8.1.16	4 29	Urbanització i millora c/ Menéndez Pelayo	4/2010					
8.1.17	4 30	Urbanització i millora c/ Martí i Franques	4/2010					En fase de redacció de projecte
8.1.18	4 31	Estudi de confortabilitat i ús dels elements per a la millora al c/ Pintor Pahissa	4/2009					En fase d'estudi

## Pedralbes

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.19	4 32	Urbanització i millora c/ Jordi Girona (de Gran Capità a Tinent Coronel Valenzuela)	4/2009					En fase de redacció de projecte i en tràmit de signatura conveni UPC
8.1.20	4 33	Urbanització i millora Ptge. Ametllers (d'Ametllers a Av. Pearson)	1/2011					
8.1.21	4 34	Urbanització i millora zona Gran Capità (d'Av. D'Esplugues a Cavallers)	4/2010					
8.1.22	4 35	Connexió c/ Font del Lleó-Caterrera de les Aigües	4/2010					

Pla d'Equipaments								
Desenvolupar el pla d'equipaments								
CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
2.1	4	36	Actualitzar i aprovar PED					S'ha convocat la comissió i s'han iniciat els treballs de revisió i actualització dels documents.
2.22	4	37	Edició mapa-guia d'equipaments i serveis					
2.2	4	38	Impulsar construcció residència i centre de dia GG c/ Benavent					CONVENI GENERALITAT. En fase de redacció del projecte.
2.3	4	39	Impulsar construcció llar-residència malalts mentals c/ Equador					CONVENI GENERALITAT. Iniciades les obres en execució.
2.4	4	40	Impulsar construcció Centre salut mental i trasllat CAP Montnegre a c/ Equador					CONVENI GENERALITAT. Iniciades les obres en execució
2.5	4	41	Nova biblioteca de districte c/ Comtes de Bell-lloc					
2.6	4	42	Nova ludoteca infantil c/ Guitard					En fase de redacció de projecte
2.7	4	43	Obtenir i cedir sòl a la Generalitat per IES Europa-Anglesola					En tràmit fase de gestió urbanística
2.8	4	44	Trasllat i ampliació escola bressol Xiroi a Europa-Anglesola					En fase de redacció de projecte
2.9	4	45	Impulsar trasllat i millora Escola educació especial Esclat a c/ Guitard					Obres en execució
2.10	4	46	Impulsar trasllat Escola Paideia					
2.11	4	47	Recuperar Casa Hurtado com equipament					
2.12	4	48	Recuperar edifici Telefónica C. Bordeus com equipament					1- Gestions amb Telefónica i Patrimoni.
2.13	4	49	Nou edifici administratiu per ampliar Seu Dte.					Pendent aprovació planejament, en tràmit del projecte ; concurs per la redacció.
2.15	4	50	Restauració i millora del Monestir de Pedralbes					En fase de redacció projecte
2.16	4	51	Seguiment del futur projecte Barça enriqueixi la xarxa d'equipaments					

2.17	4	52	Impulsar una nova escola bressol a La Maternitat i San Ramon	4/2009					
2.18	4	53	Estudiar la possible reubicació CAP La Maternitat	1/2011					
2.19	4	54	Estudiar la possibilitat d'una pista d'skate al districte	1/2011					
2.20	4	55	Treballar per aconseguir la cessió a la ciutat de la Caserna del Bruc	1/2011					S'està portant a terme negociacions des dels serveis centrals. Aprovada i notificada al Ministeri de Defensa una moció en data 17/10/1007 per la qual, s'insta la devolució a la ciutat del quartel
2.21	4	56	Nova ubicació Casal de Joves	1/2011					S'ha concretat l'ubicació.
6.2	4	57	Acord amb les Universitats pel futur ús dels veïns i veïnes, de les instal·lacions esportives universitàries	4/2011					

## Pla de millores dels equipaments

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
9.1.1	4	58	Reforma i millora del pavelló de l'Illa					Encarregat estudi de viabilitat
9.1.2	4	59	Gespa artificial al camp Aristides Maillol					Projecte redactat pendent de licitació
9.1.3	4	60	Millora acústica i manteniment al CC Les Corts					
9.1.4	4	61	Finalitzar rehabilitació i recuperació CC Can Deu					Ha finalitzat la darrera fase de rehabilitació del centre i va reiniciar les activitats el el passat 5 de maig de 2008.
9.1.6	4	62	Millores dels Casals de la Gent Gran					
9.1.7	4	63	Revisió dels espais esportius escolars per facilitar si s'escau la seva obertura als esports d'equip					En fase de redacció del projecte de millora del CEIP Les Corts i en estudi, la resta dels centres.
nou	4	64	Trasllat i nova ubicació CSS Zona Oest per aplicació del nou model de Serveis Socials					LÍNIA REDEFINIDA PEL NOU MODEL SERVEIS SOCIALS . En fase de localització nova ubicació. Aquesta mesura substitueix la línia 9.1.5. del PAD aprovat el desembre de 2007, degut al nou model de Serveis Socials.
nou	4	65	Trasllat i nova ubicació CSS Zona Est per aplicació del nou model de Serveis Socials					LÍNIA REDEFINIDA PEL NOU MODEL SERVEIS SOCIALS. En fase de localització nova ubicació.

## Règim interior

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
13	4	66	Treballar per desenvolupar l'Estatut del Conseller de Dte	4/2008					S'ha desenvolupat diverses reunions amb Consellers i Portaveus
14.7	4	67	Presentar document de Seguiment de l'estat d'execució del PAD	feb-08					

## Atenció a la ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
14.1	4	68	Millorar atenció ciutadana potenciant mitjans telemàtics	2/2009					S'està estudiant la incorporació de Kiosk de tràmits segons model districte de L'Eixample.

## 5 Acció Social i Ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.9	5	1	Creació de noves places de residència i centre de dia, i apartaments tutelats per a gent gran	1/2011					
1.12	5	2	Programa de seguiment de persones que viuen soles en situació precària	1/2011					
3	5	3	Impulsar el pla comunitari juntament "Bons veïns, millor barri"	1/2011					S'ha incorporat un tècnic comunitari en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari i s'han iniciat els treballs per a la diagnosi de les Entitats del Districte
1.31	5	4	Promoure el voluntariat social a tots els àmbits	1/2011					

## Infància

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.2.	5	5	Participació entitats en la millora dels serveis d'infància i projecte de nova ludoteca	1/2009					En la fase de redacció del projecte de la nova ludoteca, s'incorpora la Participació de les entitats de les Entitats Infantils i juvenils a través de la Plataforma.

## Gent gran

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.7	5	6	Foment de l'activitat cultural per a la gent gran i de la tasca aules d'extensió universitària	1/2011					Ubicació definitiva de l'aula zona Est al Centre Cultural Les Corts
1.8	5	7	Treball en xarxa dels CGG a través del Consell	1/2011					
1.32	5	8	Activitats intergeneracionals (infants i gent gran)	1/2011					S'ha començat a treballar en el disseny de nous projectes.
1.25	5	9	Act. que integren a la gent gran en grups potenciant actituds saludables	1/2011					

## Persones amb discapacitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.13	5	10	Programa de sensibilització i coneixement dels diferents col·lectius amb discapacitats	1/2011					Activitats en el marc del Dia Internacional de les Persones discapacitades.
1.14	5	11	Programa d'adaptació de barreres (espai públic i equipaments)	4/2010					Està en marxa l'estudi per programar el pla de millora
1.15	5	12	Itineraris de semàfors sonors	1/2011					S'ha portat a terme una reunió de valoració del Pla amb les entitats de cecs del Districte.
1.16	5	13	Eliminació de barreres de comunicació principalment disminució auditiva en serveis públics	4/2009					El Pla per la eliminació de barreres en la comunicació al Districte amb la instal·lació de dos bucles magnètics, està previst iniciar-ho l'any 09.
1.17	5	14	Pla de reserves de places d'aparcament al voltant d'equipaments públics	4/2008					Ha finalitzar l'estudi amb la proposta d'ubicacions en fase d'implantació finals 2008
1.24	5	15	Suport a les entitats que treballen amb persones amb discapacitats que incidint en temes de salut	1/2011					2 reunions anuals de coordinació amb referent de salut per la realització d'una jornada/conferència informativa i de sensibilització en espais municipals de Districte.
1.29	5	16	Afavorir la integració laboral de sectors de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual	1/2011					Coordinacions amb la Plataforma d'Entitats participant, afavorint i donant suport a projectes d'inserció laboral i a través de les Comissions de treball.
12.4	5	17	Consolidar Plataforma de Persones amb Discapacitat	1/2011					Amb activitats de: sensibilització (Dia Inter. Pers. Disc.) formació (entitats i professionals) gestionant serveis amb el Dte. (horts urbans, mides compensatòries en benefici a la comunitat amb recerca de serveis.

**Salut pública**

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.23	5	18	Xerrades per difondre la relació esport-salut i especial atenció esport femení	4/2010					S'està començant a treballar amb els CEIPS interessats en el disseny del projecte
1.26	5	19	Programes de prevenció i promoció de la salut als infants i gent gran prioritàriament	4/2010					S'ha realitzat una xerrada sobre l'Alzheimer al Centre Cultural Riera Blanca i s'està treballant un projecte pels infants i salut.
1.27	5	20	Jornades sobre Salut	1/2011					Previsió realitzar primeres jornades febrer 2009.
1.28	5	21	Suport a entitats de salut i/o discapacitats oferint espais de trobada i atenció als afectats i als seus familiars	1/2011					S'està treballant per a portar a terme una xerrada sobre l'estrès conjuntament amb l'A. Catalana de Fibromiàlgia i l'A. Catalana de Fatiga Crònica.
1.33	5	22	Potenciar programes de salut comunitària	1/2011					S'està començant a treballar en el marc del Consell de Salut i es preveu l'execució de la primera activitat el segon trimestre del 2008

**Drets civils**

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.30	5	23	Impulsar el treball en xarxa de les entitats del sector des del Consell de Drets Civils i Cooperació	1/2011					S'ha començat a programar les activitats a portar a terme durant l'any 2008 conjuntament districte i els membres del propi Consell.



## 6 Prevenció, Seguretat i Mobilitat

### Prevenció i Seguretat

#### Convivència i ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
11.1	6	1	Espais lúdics i treball per a la convivència del dte.	1/2011					S'ha posat en marxa la taula de convivència del Districte. S'ha impulsat la campanya de sensibilització i convivència al Casc Antic
11.2	6	2	Continuar programes d'intervenció educatives i en benefici comunitat	1/2011					S'ha arribat un acord amb la Plataforma de Persones amb Discapacitat, per a què acullin usuaris que tinguin que fer mesures amb benefici a la comunitat
11.3	6	3	Actuacions de la GU pel control i vigilància del civisme a l'espai públic els caps de setmana	1/2001					Continua la patrulla de Guàrdia Urbana de civisme els caps de setmana

#### Seguretat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
11.4	6	4	Desenvolupar funcions de policia comunitària i de proximitat de la GU	1/2011					S'han portat a terme reunions, actes i activitats conjuntes amb les entitats i associacions del barri. El total d'actuacions realitzades és 100.
11.5	6	5	Continuar convocatòries del Consell de Seguretat i Prevenció i la Meses de coordinació policial	1/2011					Continua les meses de Coordinació Policial amb periodicitat trimestral.

### Mobilitat i Accessibilitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.3.1	6	6	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament en l'àmbit d'Europa-Anglesola	3/2008					En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat
10.3.2	6	7	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament en l'àmbit Colònia Castells	3/2008					En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat
10.3.3	6	8	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament Pl. Can Rosés	3/2008					En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat
10.6	6	9	Ampliar Àrea Verda del dte (Zona Universitària, Les Corts Sud, Mejia Lequerica i Sant Ramon)	4/2009					En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat
10.7	6	10	Ordenar i incrementar espais d'estacionament (especialment vehicles dues rodes)	1/2011					S'ha iniciat l'estudi de les necessitats per part de la Guàrdia Urbana del Districte


10.8	6	11	Disminució de l'accidentalitat i millorar la fluïdesa viària instal·lant més semàfors	1/2011				S'ha iniciat l'estudi de fluïdesa viària per part de la Guàrdia Urbana del Districte
10.9	6	12	Millorar mobilitat entorns Camp Nou	1/2011				Està sol·licitat al Sector de Mobilitat a l'espera de la seva resposta.
10.10	6	13	Continuar amb el Programa d'Educació Viària	1/2011				S'està treballant el programa d'Educació Viària amb un total de 3000 alumenes.
10.11	6	14	Impulsar obres d'accessibilitat L3 parada Les Corts	4/2009				
10.12	6	15	Nous punts Bicing i ampliació d'aparcaments de bicis del dte.	1/2011				
10.13	6	16	Estudiar possible implementació Zona 30	1/2011				En fase d'estudi per part del Sector de Mobilitat
10.14	6	17	Impulsar fórmules per allargar tram i unió de les dues xarxes de tramvia	4/2010				
10.15	6	18	Estudis de mobilitats i Pla de millora del transport públic per a tots els barris, en especial voltats centres educatius	4/2010				S'ha tingut les primeres reunions amb TMB i el Sector de Mobilitat i està convocada la Comissió de Mobilitat per començar a treballar en l'elaboració d'aquests Plans.
10.16	6	19	Demandar estudi de la carència de pas dels vianants als semàfors de l'Av Diagonal	4/2008				S'ha formalitzat la demanda al Sector de Mobilitat, està en fase d'estudi
10.17	6	20	Impulsar accessibilitat parades de bus amb plataformes de formigó, i allà on sigui possible senyalitzar la parada	4/2010				S'ha començat a treballar amb TMB
10.18	6	21	Demandar estudi de nou recorregut Nit Bus per la Travessera de les Corts	4/2008				Línia incorporada en el marc del Pla de millora del Transport Públic (línia 6.18)
10.20	6	22	Elaborar mapa d'impacte de l'Ordenança de Circulació 15 setembre 2007	4/2010				

10.21	6	23	Mapa-Guia d'aparcaments públics i privats, de residents i de rotació	4/2010					
10.22	6	24	Promoure l'allargament de la L3 i dels FGC fins Hospital Sant Joan de Déu	1/2011					
10.4	6	25	Impulsar nova estació de metro L5, intercanviador de tram de Sant Ramon	2/2010					Obres en execució
10.5	6	26	Impulsar nova L9 metro, al seu pas per Les Corts	1/2011					Obres en execució
10.23	6	27	Estudi de viabilitat de cobriment Ronda de Dalt, per aparcament pels autocars escolars per millorar mobilitat zona	1/2011					S'està treballant amb l'elaboració de l'estudi per part del Sector d'Urbanisme.

## 4. CONCLUSIÓ

De l'Estat D'execució del Pla D'Actuació del Districte de Les Corts, durant el 1r Semestre del 2008, destaquem que el 2% de les mesures estan ja finalitzades, 71% estan en marxa i tant sols el 27% està pendent d'inici.

Destacar, que en aquest informe s'avalua el primer semestre del quadrienni 2008-2011, però a pesar de ser el primer informe que es presenta, 136 de les mesures ja estan en marxa o ja han finalitzat, la qual cosa ens confirma un bon ritme d'execució de les mesures i un correcte compliment del calendari establert a l'inici del quadrienni 2008-2011.

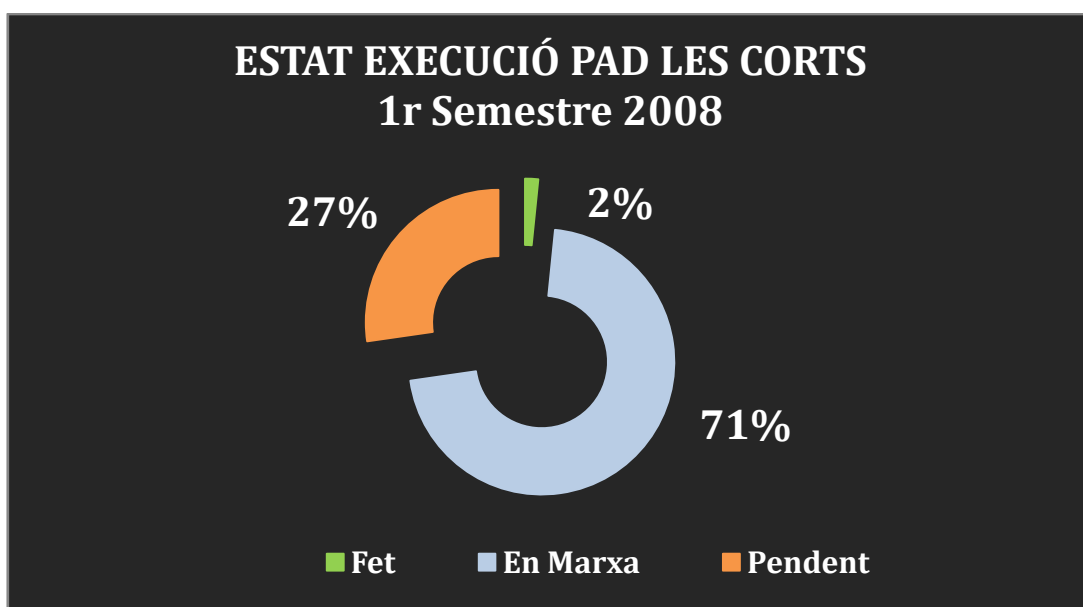

De les mesures ja finalitzades destacar la construcció del Nou Hort Urbà i Zona Verda a l'Av. Pearson; la posada en marxa, el passat 5 de Maig de 2008, de les activitats en el Centre Cívic Can Deu després del procés de rehabilitació integral del centre i la presentació del 1r informe de l'estat d'execució del Pla d'Actuació del Districte, inclòs dins del compromís de presentar-ho semestralment durant tot el quadrienni 2008-2011.
